

Les fondements de la méthode Scrum

de Arnaud Grob

Fichiers d'exercice

Ces fichiers d'exercice sont un complément au cours « Les fondements de la méthode Scrum » de <https://www.linkedin.com/learning/>.

EXERCICE n°1 – LA VELOCITE D'UN SPRINT


Au début d'une revue du sprint, le kanban des tâches est le suivant :

SPRINT 2	A FAIRE	EN COURS	FINI	POINTS BLOQUANTS
Story A 8 points				
Story I 13 points				

Quelle est a priori la vélocité de ce sprint ?

EXERCICE n°2 – ANALYSER UN BURNDOWN DE RELEASE

Grâce à un logiciel spécialisé, il a été possible de réaliser le burndown de release suivant :

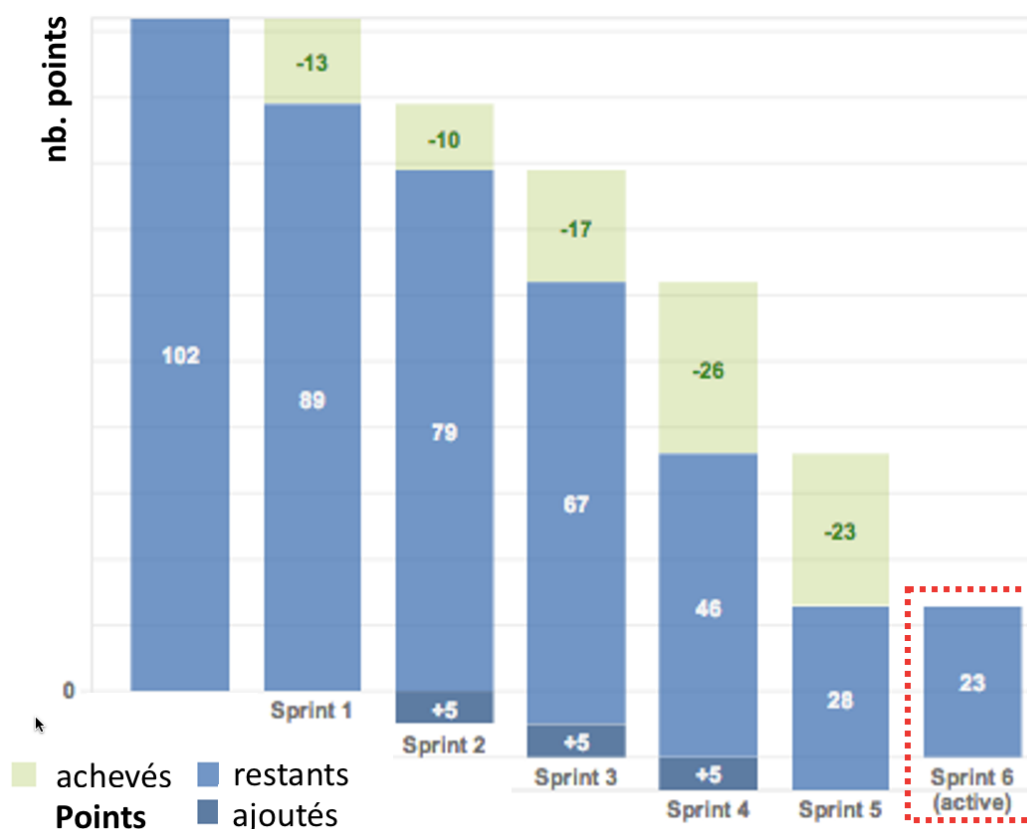

Sachant qu'une release contient 6 sprints et que l'on est actuellement en train de démarrer le sprint n°6, pensez-vous qu'il sera possible de livrer l'incrément de release prévu ?

REPONSE EXERCICE n°1

D'après le kanban, toutes les tâches de la story I (13 points) ont été achevées : elle peut a priori être considérée comme étant finie. La story A (8 points), en revanche, est toujours en cours car un point bloquant n'a pas pu être levé.

Au début de la revue de sprint, la vélocité mesurée est donc de 13 points.

Bien entendu, la situation peut être amenée à évoluer dans le cas où le Product Owner ne valide pas l'incrément réalisé (vélocité = 0 point) ou si le point bloquant peut être levé en séance (vélocité = 21 points).

REPONSE EXERCICE n°2

Pour répondre à la question, il nous faut tout d'abord examiner la vélocité des différents sprints. Celle-ci correspond aux points achevés de l'histogramme vert clair (13, 10, 17, 26, 23). Si l'on considère que l'équipe a mis du temps avant de se stabiliser à son « rythme de croisière », seuls les dernières valeurs sont significatives : on aurait donc une vélocité stabilisée à environ 23/24 points.

La capacité du sprint n°6 est de 23 points (colonne bleue représentant les points restants). Comme cette valeur est à peu près équivalente à la vélocité mesurée, il y a de bonnes chances que toutes les stories planifiées pour le dernier sprint puissent être finies.

Au final, à la fin de la release, toutes les stories attendues devaient être finies. Il y donc une très forte probabilité que l'incrément de release prévu puisse être livré.
